

川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設事業

【新消防庁舎建設現場 案内図】




【新庁舎建設工事 工程表】

	12月上旬	12月中旬	12月下旬	
庁舎棟建設工事	庁舎棟 1階柱・壁配筋工事	→		
		庁舎棟 2階梁・スラブ配筋工事	→	
	車庫棟 基礎工事	→		
造成工事	雨水貯留槽 掘削工事	→		
	外周道路 整備工事	→		




～工事の施工状況～

【庁舎棟 1階床工事が施工されました】

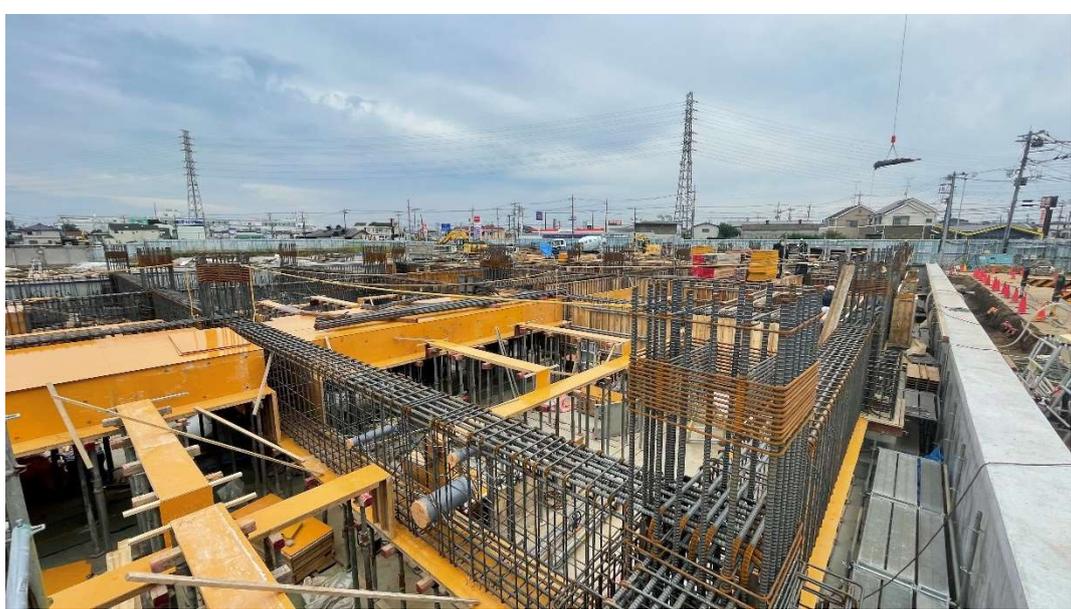

1階床梁配筋工事の施工状況 [2024.1 1月上旬]

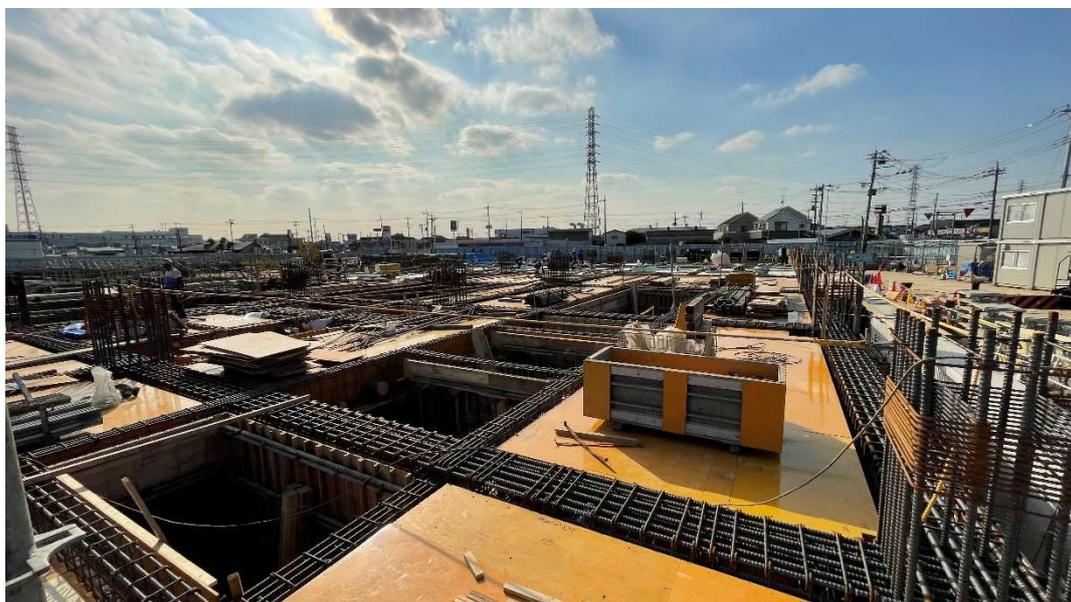

1階床型枠工事の施工状況 [2024.1 1月中旬]





1階床配筋工事の施工状況 [2024.1 1月中旬]




1階床生コン打設の施工状況 [2024.1 1月下旬]



【雨水貯留槽 掘削工事が施工されております】



掘削工事の施工状況 [2024.1 1月上旬]

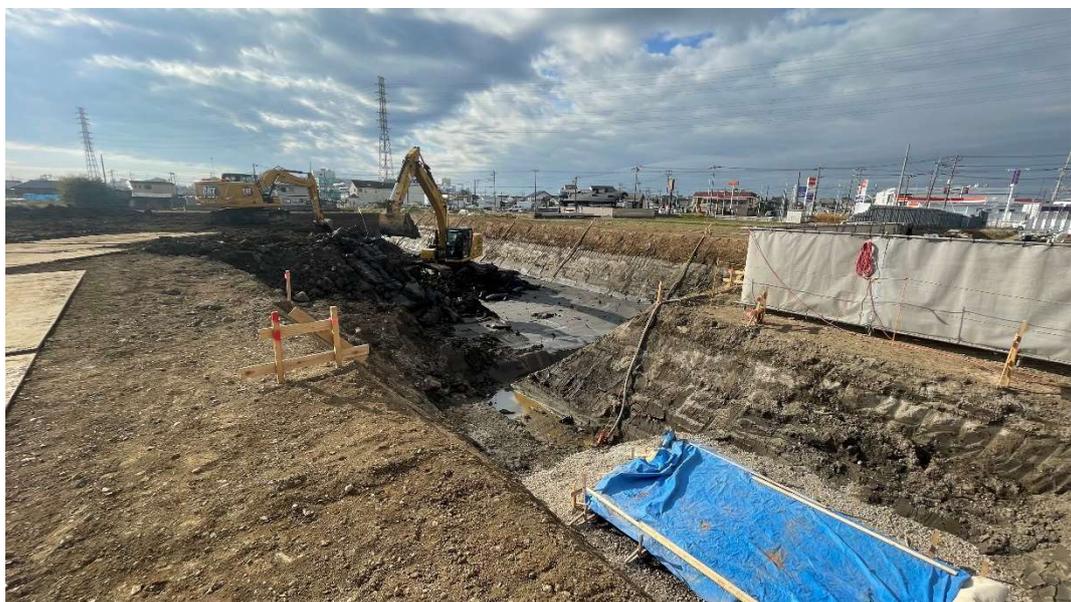

掘削工事の施工状況 [2024.1 1月下旬]

