

# 川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設事業

## 【新消防庁舎建設現場 案内図】



## 【新庁舎建設工事 月間工程表】

	2月上旬	2月中旬	2月下旬
庁舎棟建設工事	庁舎棟 2階柱配筋及び躯体型枠工事、3階床配筋工事		
造成工事	雨水貯留槽 本体設置準備	雨水貯留槽 本体設置工事	
	外周道路 整備工事		



## ～工事の施工状況～

【庁舎棟 1階躯体、2階床生コン打設工事が施工されました】




1階躯体型枠工事の施工状況 [2025.1月上旬]



2階床梁配筋工事の施工状況 [2025.1月上旬]



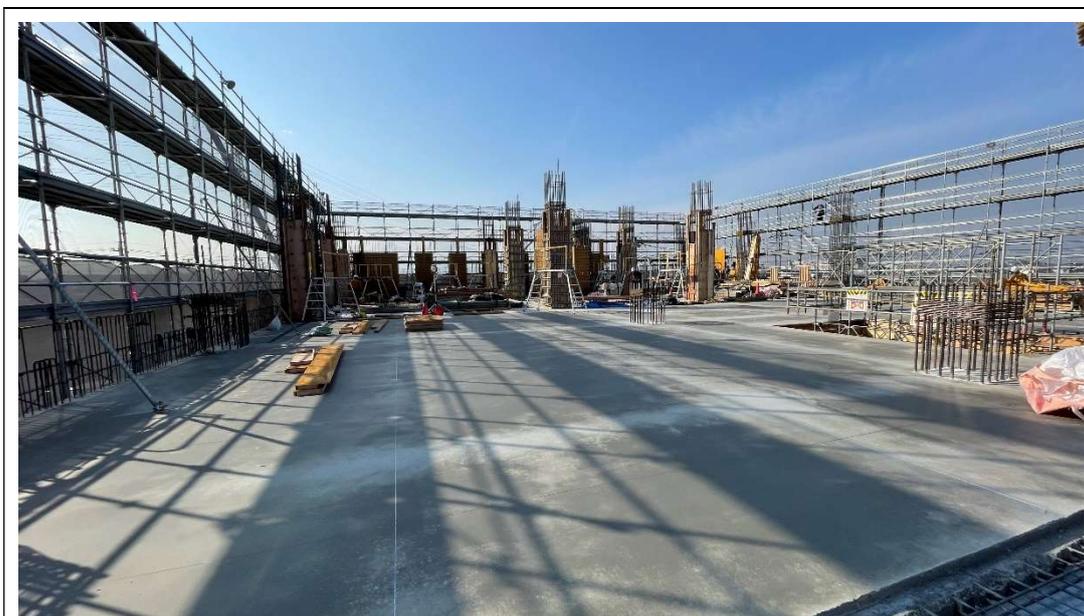

2階床生コン打設の施工状況 [2025.1 月下旬]



敷地南西側上空から撮影 [2025.1 月下旬]



【雨水貯留槽 底盤生コン打設が施工されました】



底盤生コン打設の施工状況 [2025.1 月中旬]



底盤生コン打設の施工状況 [2025.1 月下旬]



【外周道路 整備工事が施工されています】



敷地南側外周道路の整備状況 [2025.1 月中旬]



敷地南側外周道路の整備状況 [2025.1 月下旬]

