

川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設事業

【新消防庁舎建設現場 案内図】



【新庁舎建設工事 月間工程表】

| | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 |
|---------|--------------------------------------|------|------|
| 庁舎棟建設工事 | 庁舎棟 3階床生コン打設工事、3階柱配筋及び躯体型枠工事、4階床配筋工事 | | |
| 造成工事 | 雨水貯留槽 埋戻工 | | |
| | 外周道路整備 水路整備工、擁壁工 | | |



～工事施工状況～

【庁舎棟 2階躯体、3階床配筋工事が施工されました】




敷地南西側上空から撮影 [2025.2 月下旬]



2階躯体工事状況 [2025.2 月下旬]



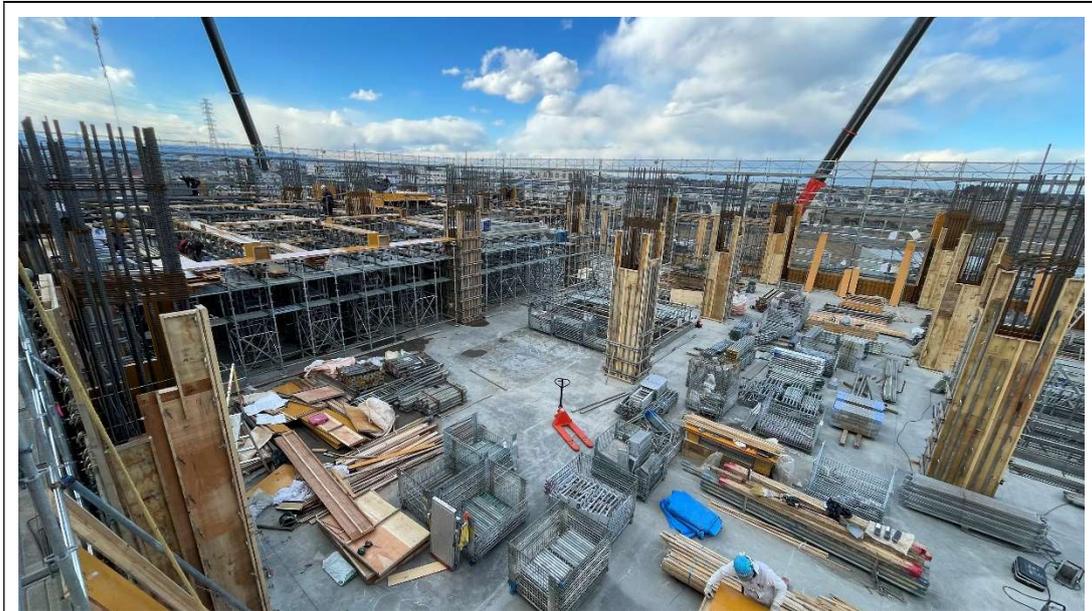


2階柱、3階床配筋工事状況 [2025.2月上旬]




3階床梁配筋工事状況 [2025.2月下旬]



【雨水貯留槽 本体設置工事が施工されています】

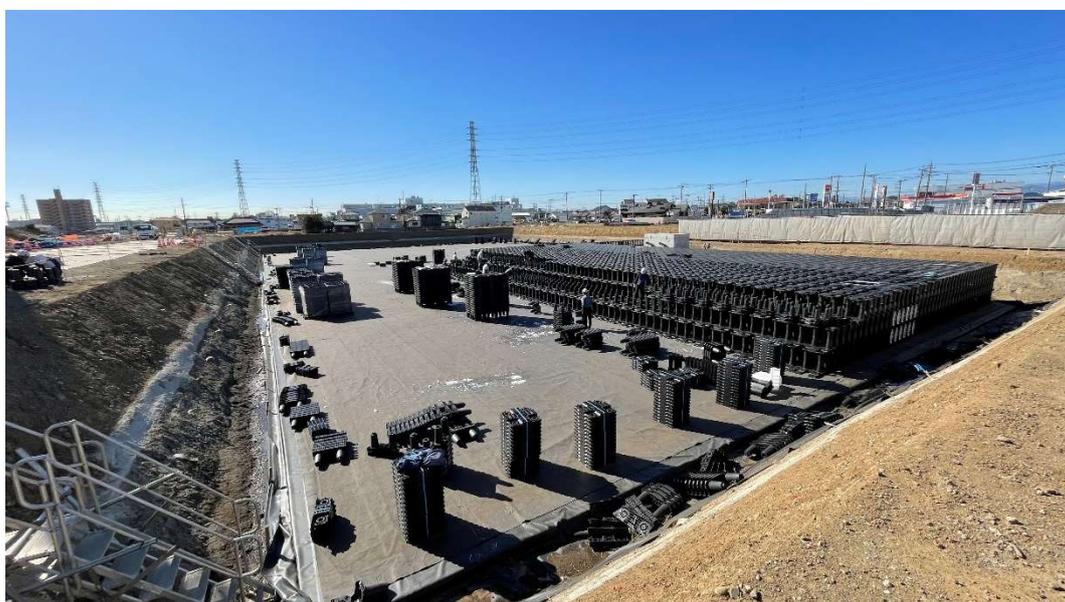


本体施工状況 [2025.2 月中旬]

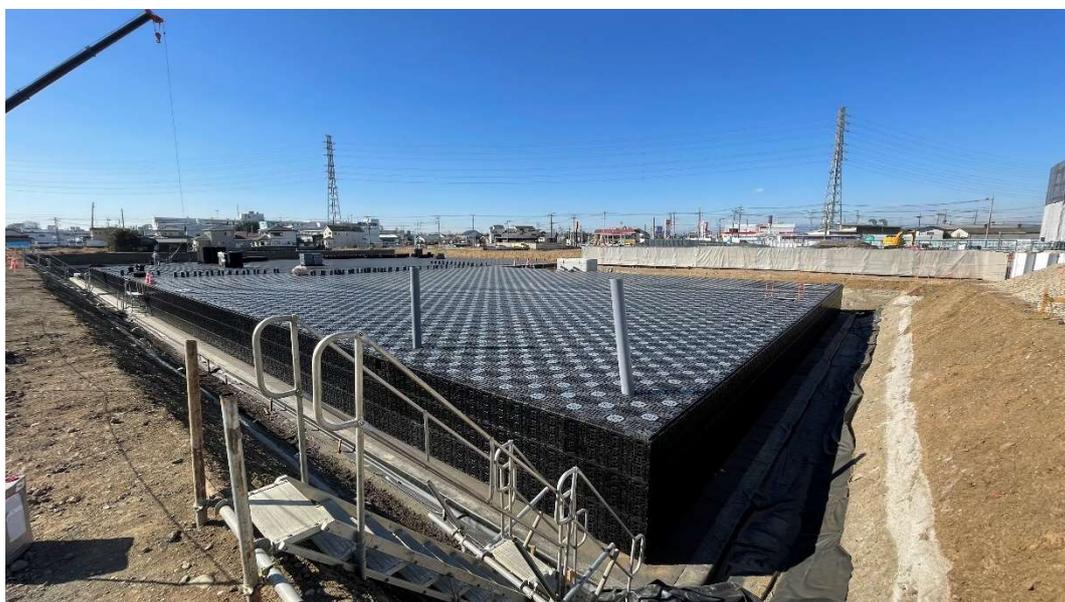

本体施工状況 [2025.2 月下旬]



【外周道路 水路整備工事、擁壁設置工事が施工されています】

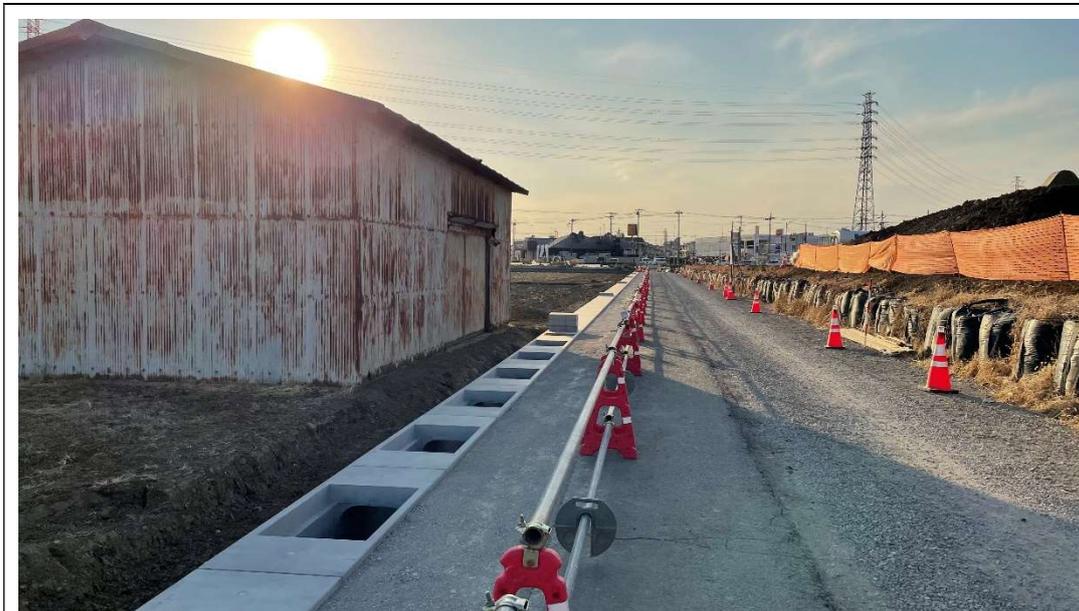

敷地南側外周道路の水路施工状況 [2025.2 月中旬]



敷地東側外周道路の擁壁施工状況 [2025.2 月下旬]

