

川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設事業

【新消防庁舎建設現場 案内図】



【新庁舎建設工事 月間工程表】

	4月上旬	4月中旬	4月下旬
庁舎棟建設工事	庁舎棟 1階内外装工事、1階設備工事		
	庁舎棟 3階躯体生コン打設工事		
造成工事	雨水貯留槽 本体埋戻し工事、ポンプ槽設置工事		
	外周道路整備 水路整備工、擁壁工		



～工事施工状況～

【庁舎棟 3階躯体、4階床配筋工事が施工されました】



敷地南西側上空から撮影 [2025.3 月下旬]



3階躯体工事状況 [2025.3 月下旬]



【雨水貯留槽 本体埋戻工事が施工されています】




本体埋戻施工状況 [2025.3 月下旬]



本体埋戻施工状況 [2025.3 月下旬]



【外周道路 水路整備工事、擁壁設置工事が施工されています】

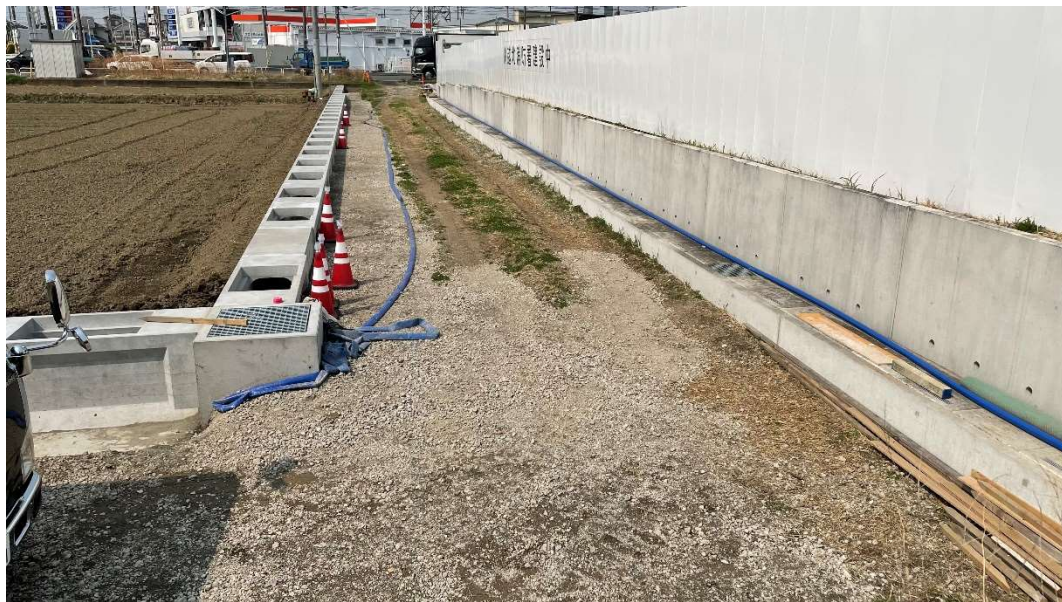

敷地南西側外周道路の水路施工状況 [2025.3 月下旬]



敷地東側外周道路の擁壁施工状況 [2025.3 月下旬]

