

# 川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設事業

## 【新消防庁舎建設現場 案内図】



## 【新庁舎建設工事 月間工程表】

	5月上旬	5月中旬	5月下旬
庁舎棟建設工事	庁舎棟 1階・2階内外装工事、1階・2階設備工事		
	庁舎棟 3階躯体生コン打設工事		
	緊急車両車庫棟 基礎工事		
造成工事	雨水貯留槽 本体埋戻し工事、ポンプ槽埋戻し工事		
	外周道路整備 水路整備工、擁壁設置工		
訓練塔建設工事	訓練塔 準備工事		訓練塔 杭工事



## ～工事施工状況～

【庁舎棟 3階躯体、4階床配筋工事が施工されています】




敷地南西側上空から撮影 [2025.4月下旬]



3階躯体工事状況 [2025.4月下旬]



【庁舎棟 1階内装、設備工事が施工されています】

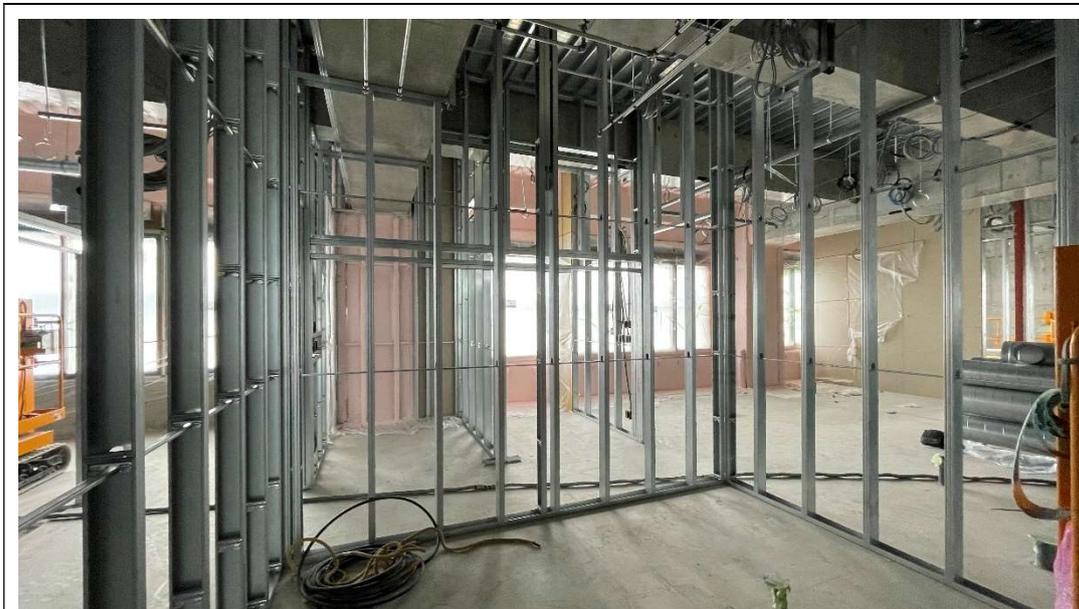

庁舎棟1階内装工事状況 [2025.4月下旬]



庁舎棟1階設備工事状況 [2025.4月下旬]



【雨水貯留槽 本体埋戻工事が施工されています】




本体埋戻施工状況 [2025.4月下旬]



本体埋戻施工状況 [2025.4月下旬]



【外周道路 水路整備工事、擁壁設置工事が施工されています】

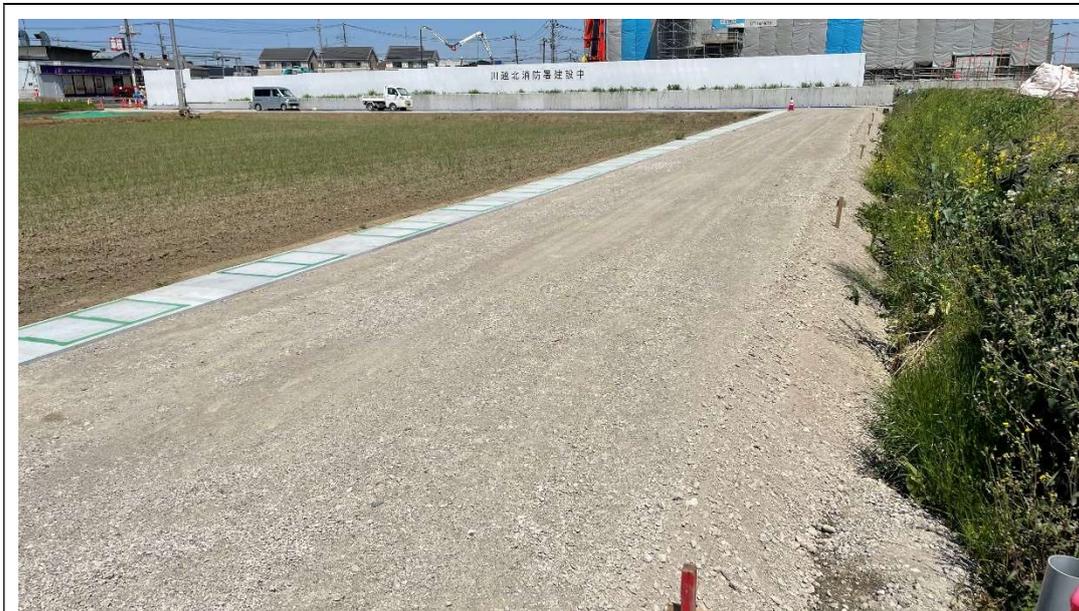

敷地南西側外周道路の水路施工状況 [2025.4 月下旬]



敷地北側外周道路の擁壁施工状況 [2025.4 月下旬]

